


週間予定表 1月10日(金)~1月20日(月)

工事名：千葉市緑区椎名崎町81番地先配水管整備工事

株式会社双葉工業

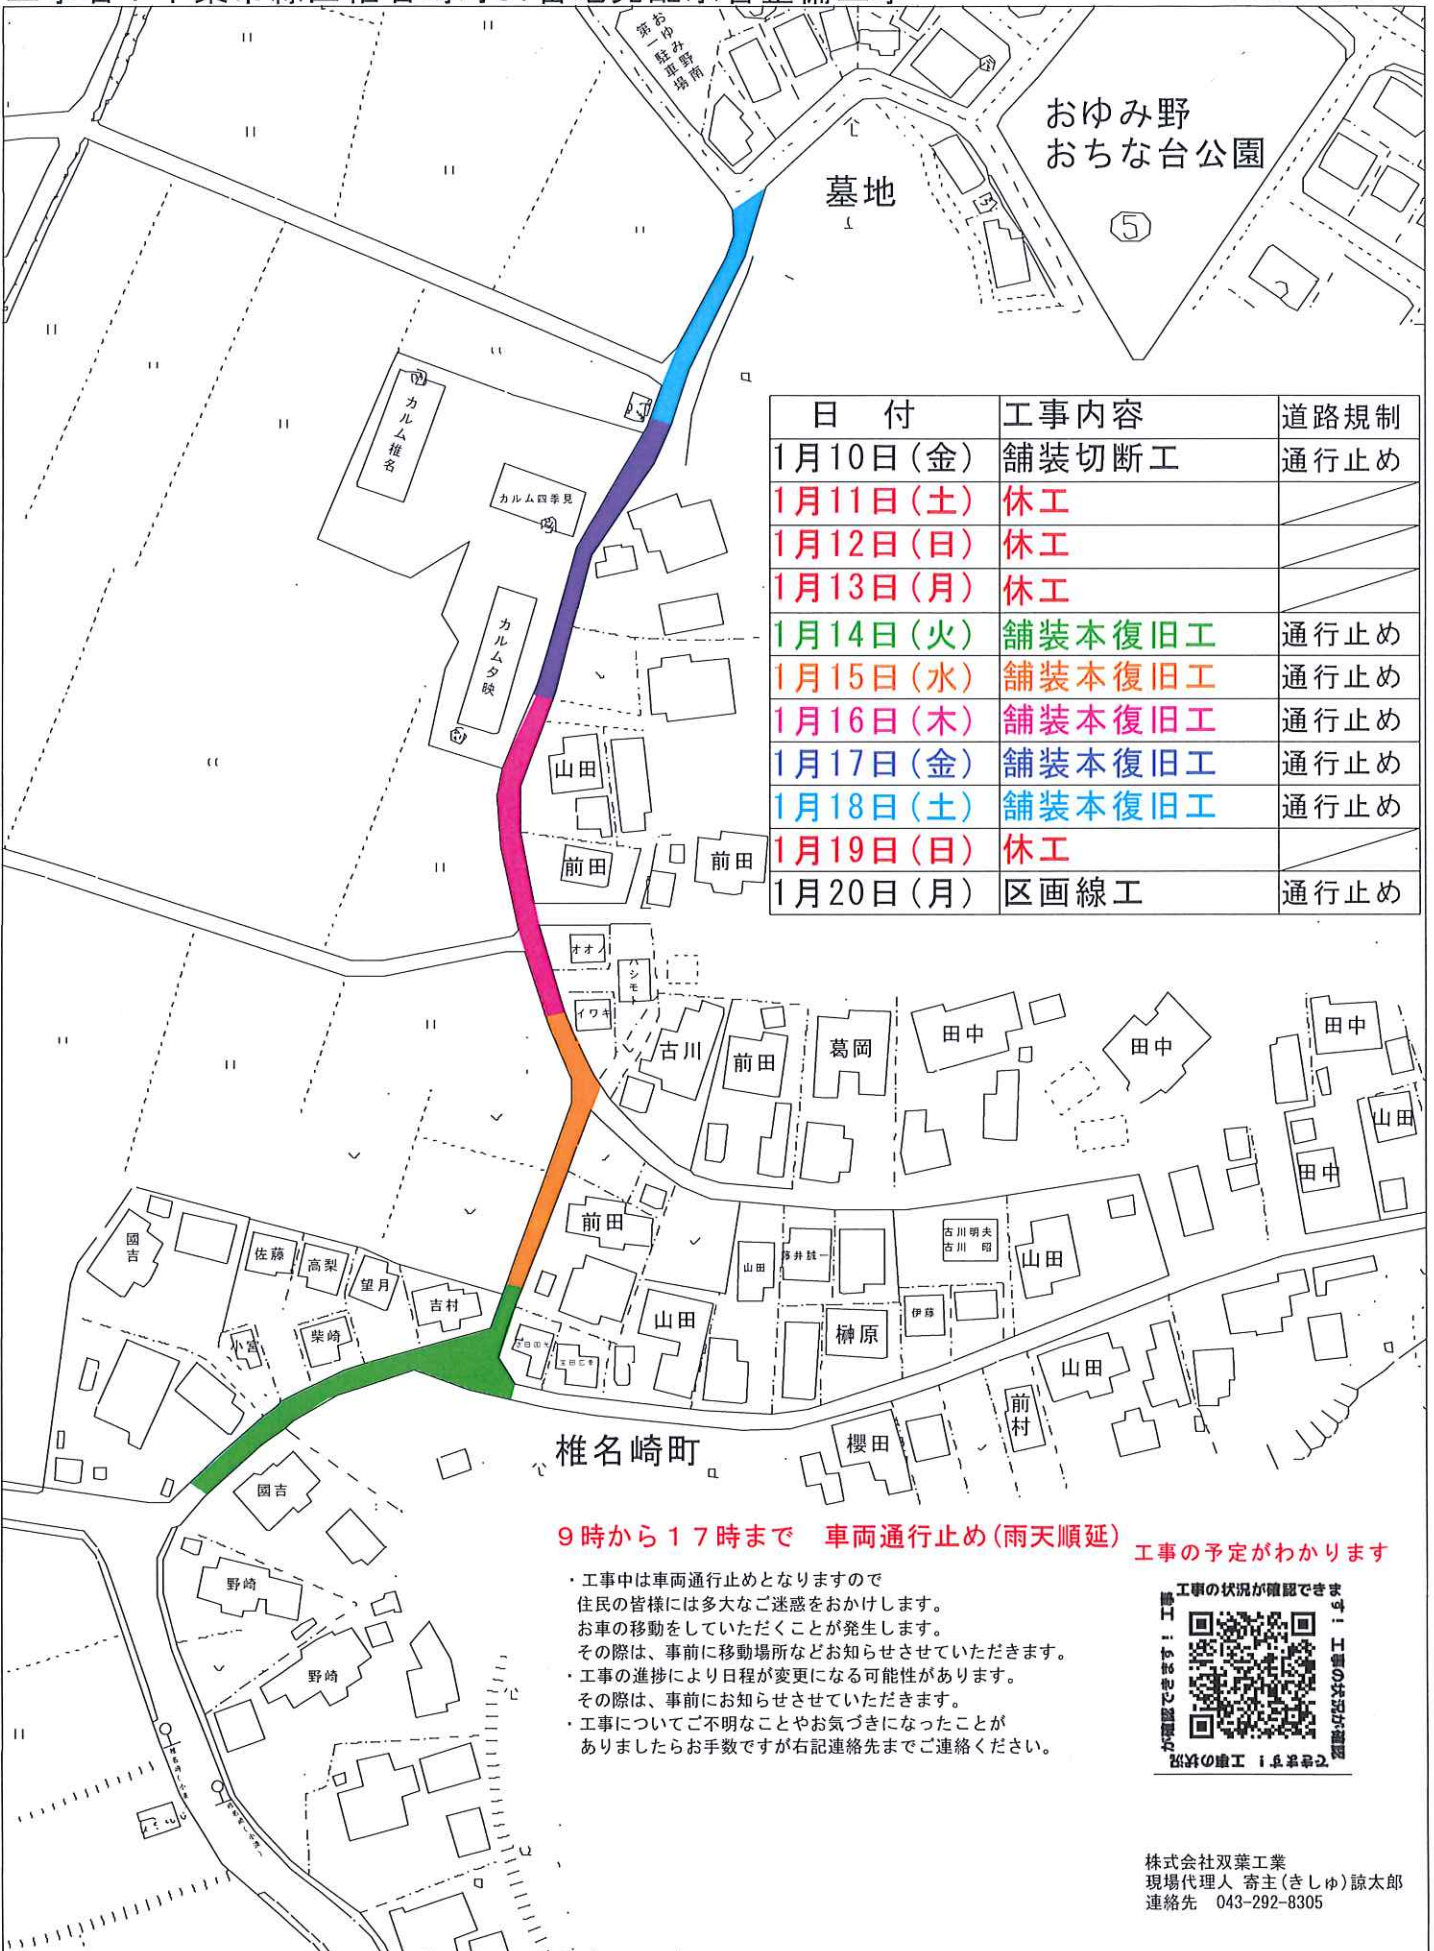

| 日付       | 工事内容   | 道路規制 |
|----------|--------|------|
| 1月10日(金) | 舗装切断工  | 通行止め |
| 1月11日(土) | 休工     |      |
| 1月12日(日) | 休工     |      |
| 1月13日(月) | 休工     |      |
| 1月14日(火) | 舗装本復旧工 | 通行止め |
| 1月15日(水) | 舗装本復旧工 | 通行止め |
| 1月16日(木) | 舗装本復旧工 | 通行止め |
| 1月17日(金) | 舗装本復旧工 | 通行止め |
| 1月18日(土) | 舗装本復旧工 | 通行止め |
| 1月19日(日) | 休工     |      |
| 1月20日(月) | 区画線工   | 通行止め |

9時から17時まで 車両通行止め(雨天順延) 工事の予定がわかります

- ・ 工事中は車両通行止めとなりますので住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。お車の移動をしていただくことが発生します。その際は、事前に移動場所などお知らせさせていただきます。
- ・ 工事の進捗により日程が変更になる可能性があります。その際は、事前にお知らせさせていただきます。
- ・ 工事についてご不明なことやお気づきになったことがありましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡ください。



株式会社双葉工業  
現場代理人 寄主(きしゅ) 諒太郎  
連絡先 043-292-8305

緑区椎名崎町付近

古い水道管から耐震管への取替を施工しています。

縮尺 1/1,500 45m
