


週間予定表 11月15日(金)~11月22日(金)

工事名：千葉市緑区椎名崎町81番地先配水管整備工事

株式会社双葉工業

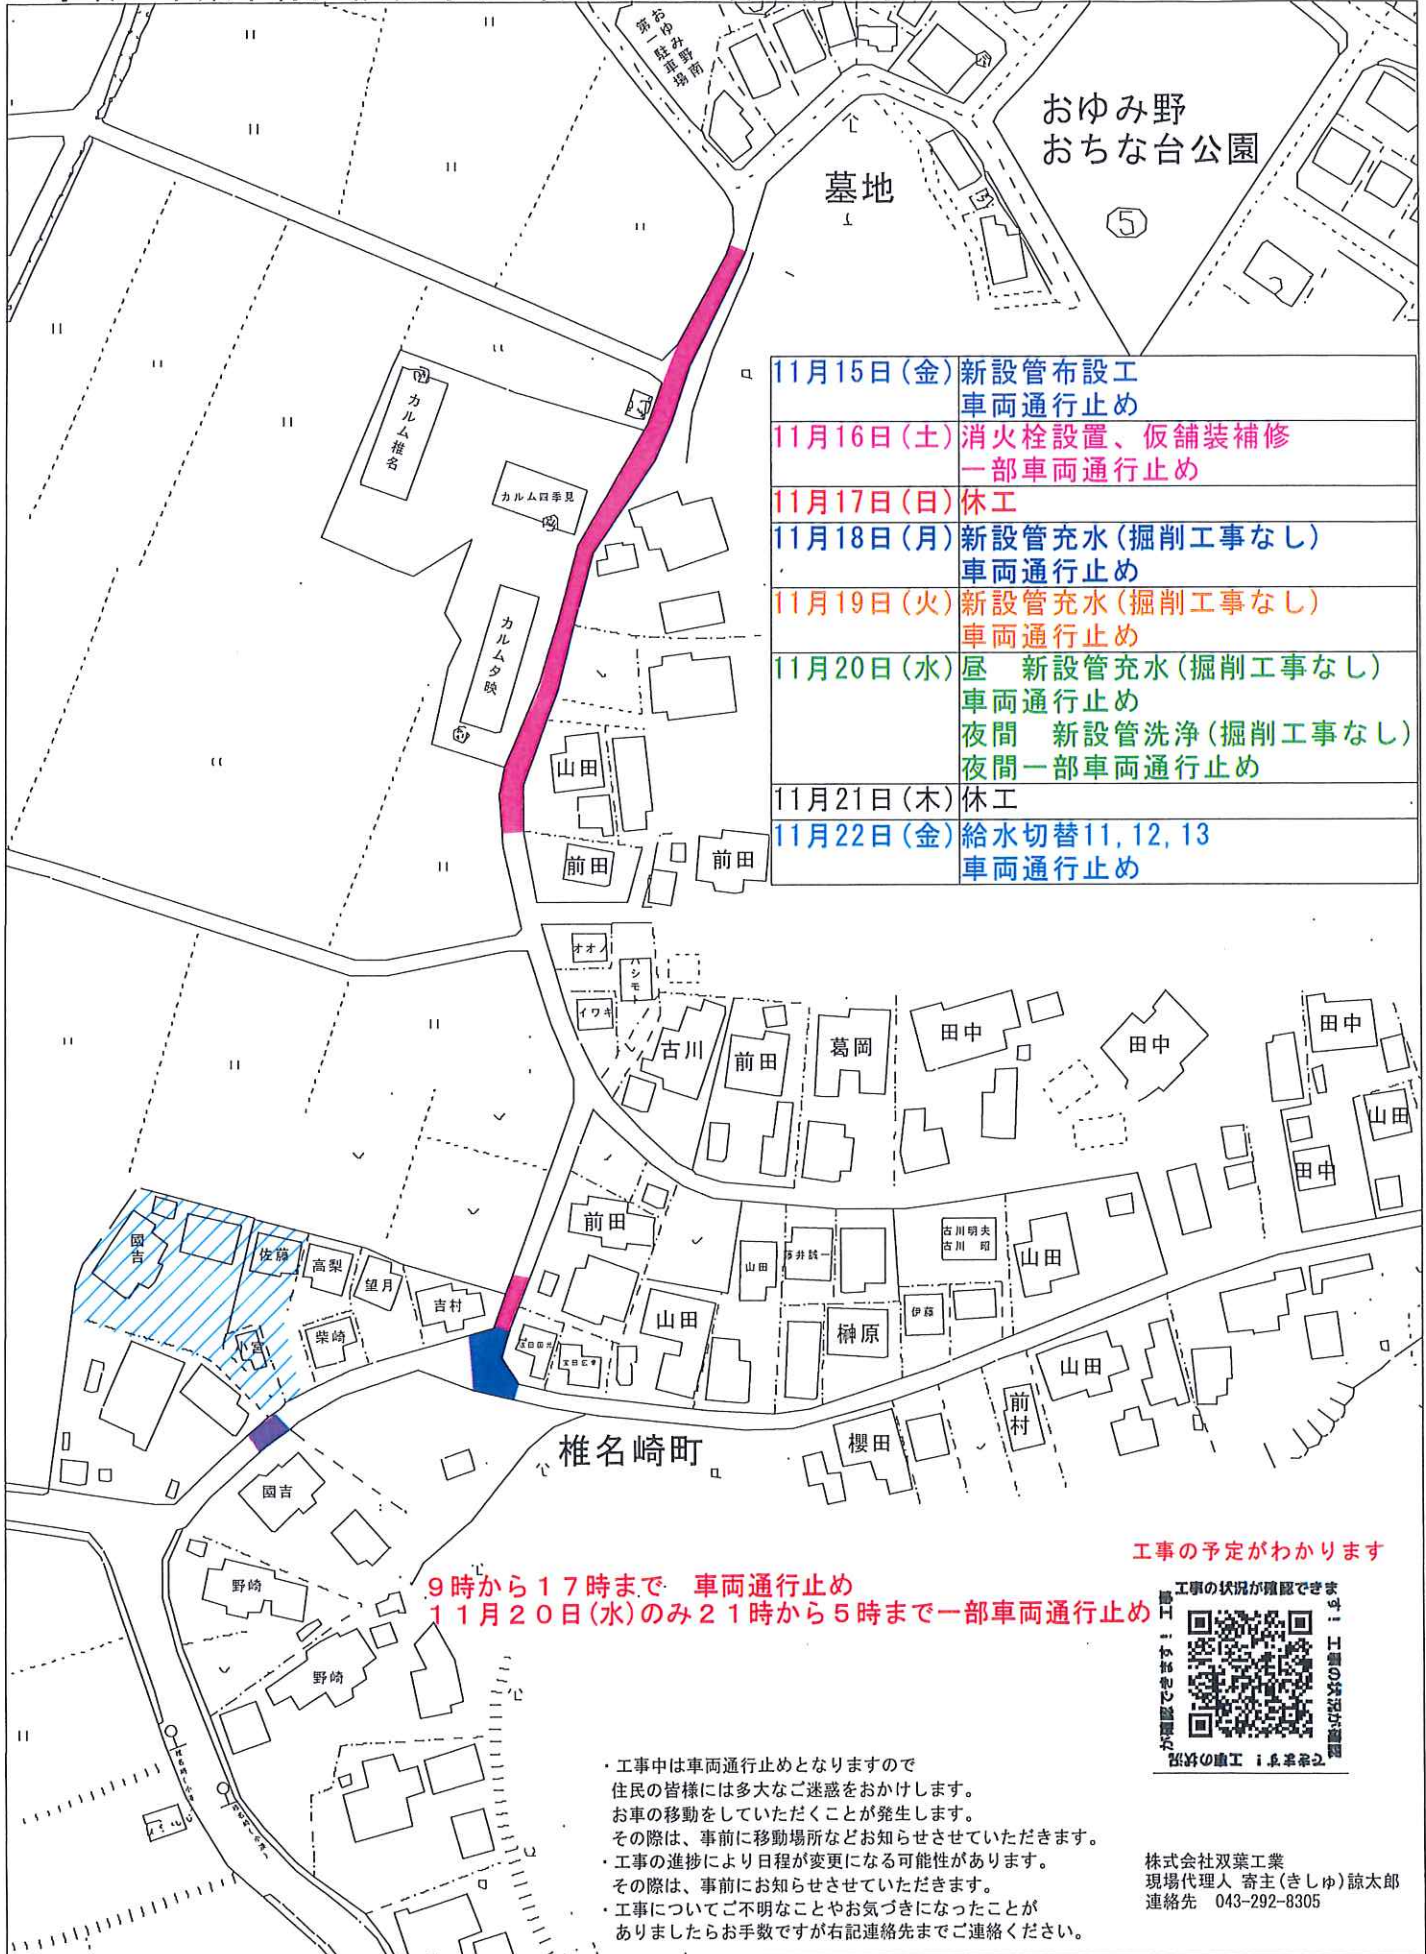

11月15日(金)	新設管布設工 車両通行止め
11月16日(土)	消火栓設置、仮舗装補修 一部車両通行止め
11月17日(日)	休工
11月18日(月)	新設管充水(掘削工事なし) 車両通行止め
11月19日(火)	新設管充水(掘削工事なし) 車両通行止め
11月20日(水)	昼 新設管充水(掘削工事なし) 車両通行止め 夜間 新設管洗浄(掘削工事なし) 夜間一部車両通行止め
11月21日(木)	休工
11月22日(金)	給水切替11, 12, 13 車両通行止め

9時から17時まで 車両通行止め
11月20日(水)のみ21時から5時まで一部車両通行止め

工事の予定がわかります



- ・ 工事中は車両通行止めとなりますので住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。お車の移動をしていただくことが発生します。その際は、事前に移動場所などお知らせさせていただきます。
- ・ 工事の進捗により日程が変更になる可能性があります。その際は、事前にお知らせさせていただきます。
- ・ 工事についてご不明なことやお気づきになったことがありましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡ください。

株式会社双葉工業
現場代理人 寄主(きしゅ) 諒太郎
連絡先 043-292-8305
