


週間予定表 千葉市中央区神明町3番地先配水管整備工事

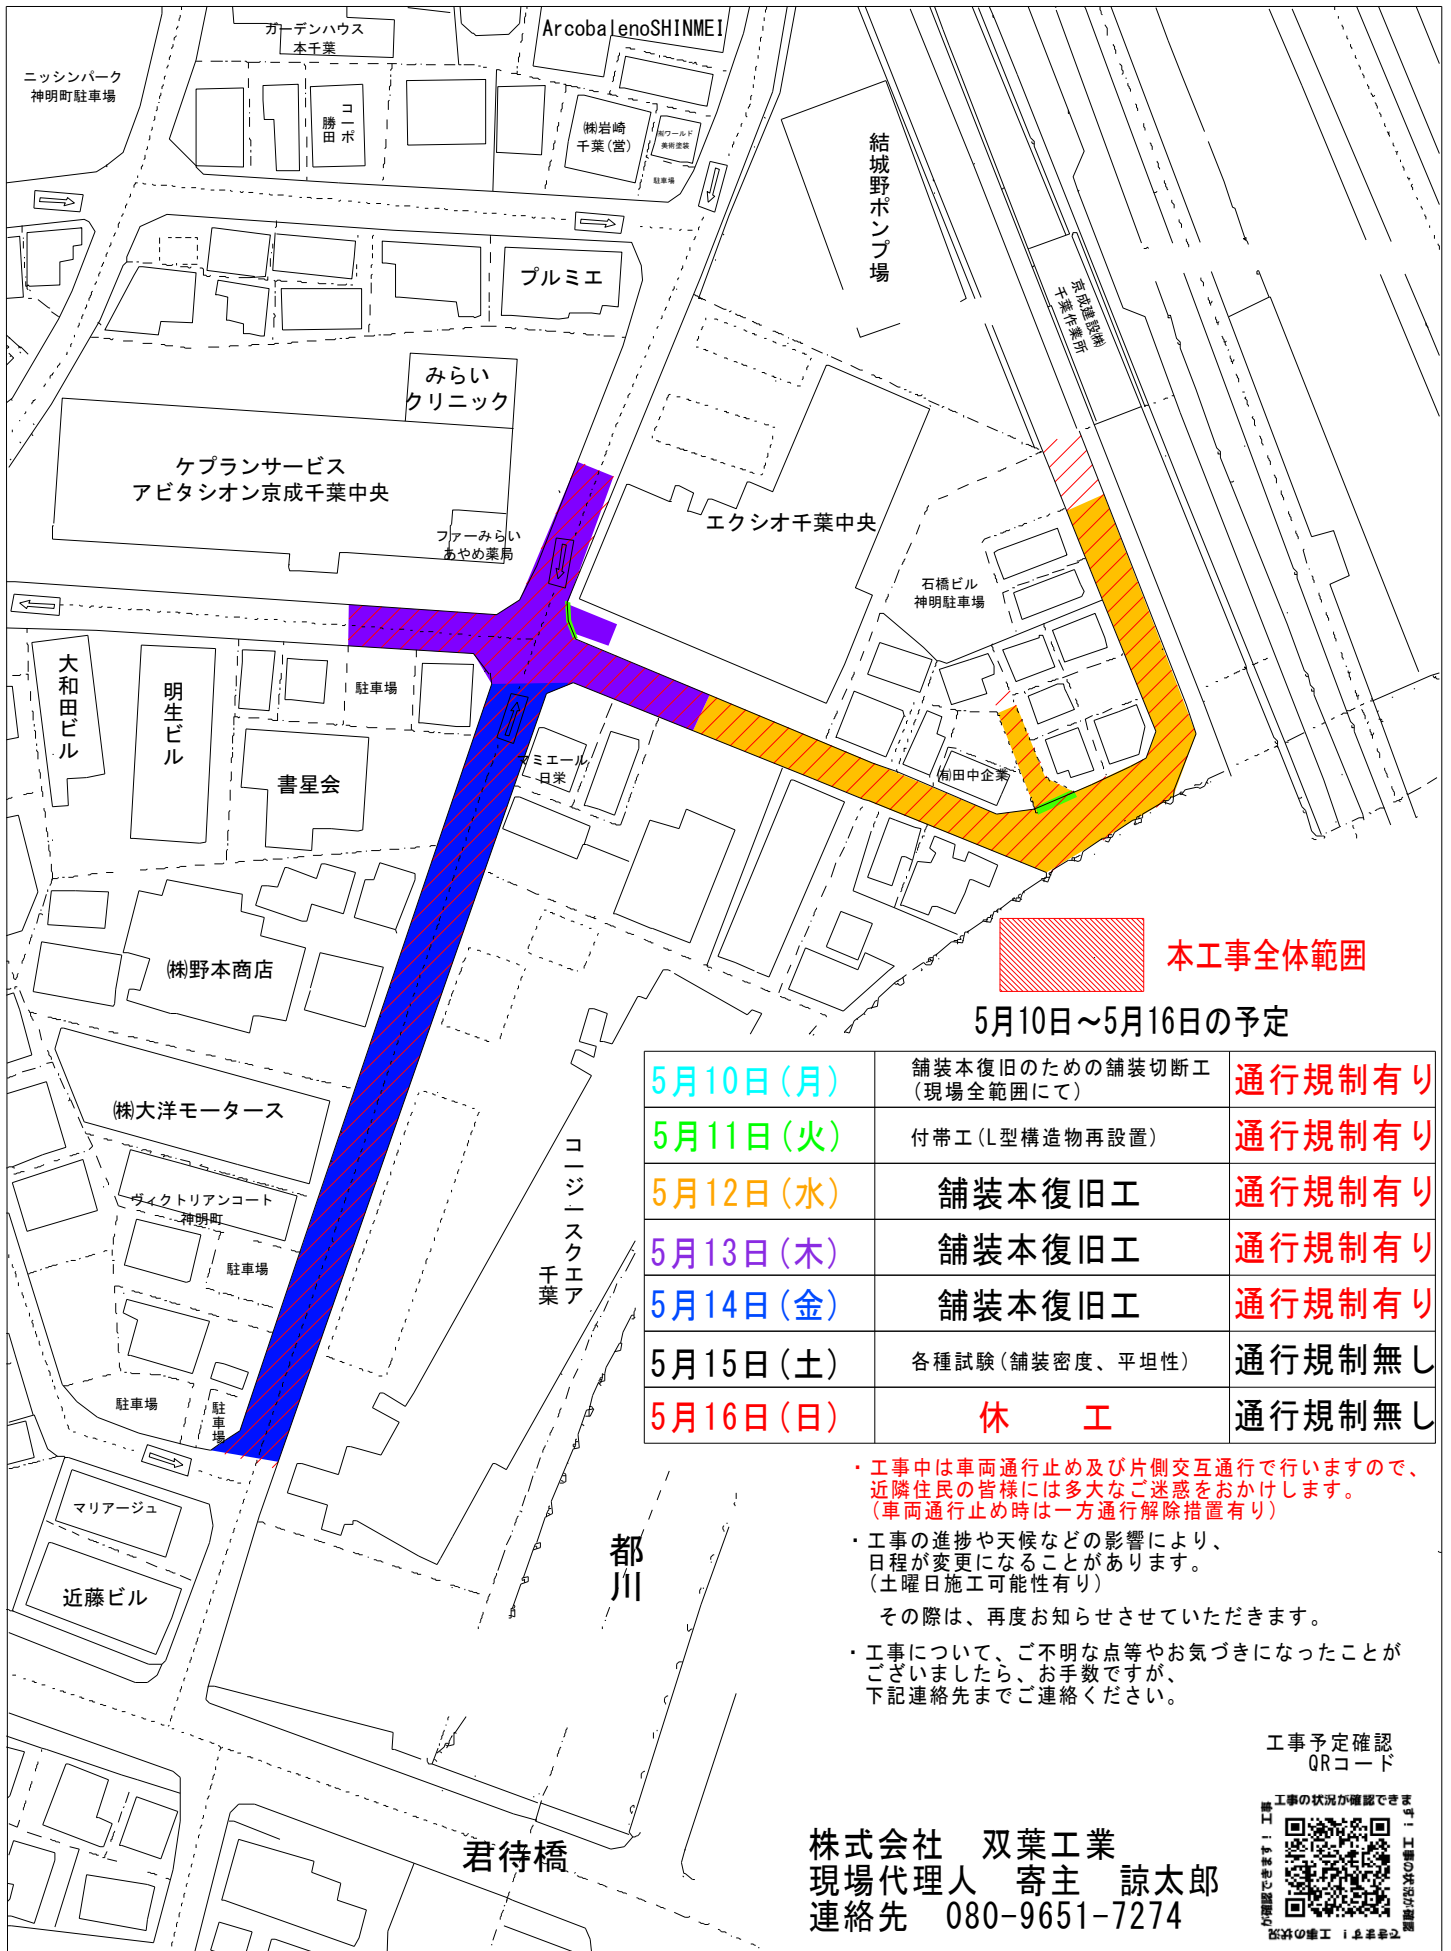

 本工事全体範囲

5月10日～5月16日の予定

5月10日(月)	舗装本復旧のための舗装切断工 (現場全範囲にて)	通行規制有り
5月11日(火)	付帯工(L型構造物再設置)	通行規制有り
5月12日(水)	舗装本復旧工	通行規制有り
5月13日(木)	舗装本復旧工	通行規制有り
5月14日(金)	舗装本復旧工	通行規制有り
5月15日(土)	各種試験(舗装密度、平坦性)	通行規制無し
5月16日(日)	休 工	通行規制無し

- ・工事中は車両通行止め及び片側交互通行で行いますので、近隣住民の皆様には多大なご迷惑をおかけします。(車両通行止め時は一方通行解除措置有り)
- ・工事の進捗や天候などの影響により、日程が変更になることがあります。(土曜日施工可能性有り)
その際は、再度お知らせさせていただきます。
- ・工事について、ご不明な点等やお気づきになったことがございましたら、お手数ですが、下記連絡先までご連絡ください。

工事予定確認
QRコード



株式会社 双葉工業
現場代理人 寄主 諒太郎
連絡先 080-9651-7274

古い水道管を地震に強い管に取替えます

株式会社 双葉工業
